



# Statusupdate

## Waalwijk Omgevingswet-proof

### Q1 2020

Deze statusupdate heeft tot doel inzicht te geven in de projectbeheersing van het project Waalwijk Omgevingswet-proof. Binnen de kaders van het door de raad vastgestelde plan van aanpak<sup>1</sup>. Wij geven u inzicht in de projectbeheersing aan de hand van de GROTICK-methodiek. De letters van het woord GROTICK staan voor de aspecten: geld, risico's, organisatie, tijd, informatie, communicatie en kwaliteit. Na een samenvatting van de status per aspect komen alle aspecten afzonderlijk aan bod.

Verklaring status
Klaar
Volgens plan van aanpak
Niet volgens plan van aanpak

## Samenvatting

Op dit moment verloopt het project op alle aspecten binnen de kaders van het plan van aanpak. Belangrijkste onderdeel in dit kwartaal is het uitwerken van de deelprojectplannen.

Projectbeheersing Waalwijk Omgevingswet-proof			
Periode: Q1 - 2020			
Aspect	Status	Omschrijving	Toelichting
G - Geld		Incidentele projectkosten, structurele kosten en baten	Uitwerken in deelprojectplannen
R - Risico's		Wetgeving, provincie, digitale stelsel, draagvlak	Idem
O - Organisatie		Organisatiestructuur en capaciteit	Idem
T - Tijd	*	Mijlpalen 2020 en 2021	Idem
I - Informatie		Overzicht, minimale acties, kapstok, quick-wins, pilots	Idem
C - Communicatie		Intern en extern	Idem
K - Kwaliteit		Letter en geest van de wet	Idem

\* Op dit moment loopt dit aspect volgens planning, behalve voor het onderdeel 'opleveren overzichten bestaande situatie'. Dit onderdeel zou in Q4 van 2019 afgerond moeten zijn. Dit onderdeel kost meer tijd dan verwacht. De verwachting is dat deze overzichten wel in Q1 van 2020 klaar zijn. De planning van de andere mijlpalen komen daarmee niet in gevaar.

<sup>1</sup> Raad, 10 okt 2019, plan van aanpak met als bijlagen een communicatieplan, organisatieplan en routeplanner zie [www.waalwijk.nl/omgevingswet](http://www.waalwijk.nl/omgevingswet)

## Geld

In het organisatieplan bij het plan van aanpak is een financiële paragraaf opgenomen met een toelichting op de incidentele projectkosten en de structurele lasten en baten. Op dit moment zijn alleen ontwikkelingen te melden als het gaat om de incidentele projectkosten.

### Incidentele projectkosten.

- Budget: 2019-2022 € 600.000,=. In de vorm van een beleidsreserve voor 2019-2022.
- Besteed in 2019: circa € 80.000,=. Definitief bedrag nog bepalen in jaarrekening 2019. Voor projectsturing van o.a. plan van aanpak, raadsprogramma, bewustwording, kennisvergaring, regionale kennisuitwisseling
- Budgetraming: nog uit te werken op basis van deelprojectplannen in Q1 – 2020.


## Risico's

In het organisatieplan bij het plan van aanpak is een paragraaf opgenomen over risicobeheersing. De daarin benoemde risico's komen in deze statusupdate terug als deelaspect: wetgevingstraject, provincie, digitale stelsel, draagvlak. De deelaspecten planning, financieel en capaciteit komen respectievelijk terug bij de aspecten tijd, geld en organisatie.

Risico's Waalwijk Omgevingswet-proof			
Periode: Q1 - 2020			
Deelaspect	Status	Omschrijving	Toelichting
Wetgeving		Nog niet alle uitvoeringsregelgeving is bekend.	In de deelprojectplannen uitwerken hoe we dit risico gaan beheersen.
Provincie		Nog niet bekend welke regels de provincie gaat opleggen aan gemeenten.	Idem
Digitale stelsel		Nog niet bekend hoe het digitale stelsel er precies uit gaat zien.	Idem
Draagvlak		Onbekendheid met letter en geest van de wet.	Idem
Planning	Zie aspect tijd		
Financieel	Zie aspect geld		
Capaciteit	Zie aspect organisatie		

## Organisatie

In het organisatieplan bij het plan van aanpak is organisatiestructuur opgenomen voor dit project. Ook gaat dit aspect over de capaciteit welke nodig en beschikbaar is voor dit project. Intern is de organisatiestructuur ingericht, zie afbeelding. Ook zijn de interne deelnemers aan stuurgroep, regieteam en deelprojecten benoemd. Voor de verschillende deelprojecten (algemeen, beleid, regels, anders werken, digitaal) worden in Q1 van 2020 deelprojectplannen gemaakt. Daarin wordt de benodigde capaciteit verder uitgewerkt.

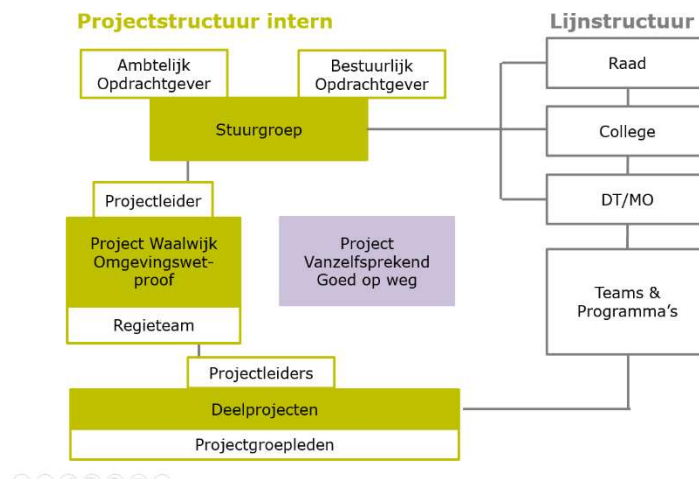

## Tijd

De inschatting van de bestuurlijke partners en de minister is, dat het wenselijk en mogelijk is de Omgevingswet per 1 januari 2021 in werking te laten treden. Onlangs heeft de minister hierover de Kamer geïnformeerd<sup>2</sup>. Medio 2020 bepaalt de Tweede kamer of de wet daadwerkelijk per 1 januari 2021 in werking treedt. Dat betekent voor de planning dat de routeplanner zoals opgenomen bij het plan van aanpak leidend is. De mijlpalen uit het plan van aanpak zijn opgenomen in een schema, zie hierna. Op dit moment loopt dit project volgens planning, behalve voor het onderdeel 'opleveren overzichten bestaande situatie'. Dit onderdeel zou in Q4 van 2019 afgerond moeten zijn. Dit onderdeel kost meer tijd dan verwacht. De verwachting is dat deze overzichten wel in Q1 van 2020 klaar zijn. Zie voor een inhoudelijke toelichting op de mijlpalen van dit kwartaal het aspect Informatie. Op basis van de deelprojectplannen wordt de mijlpalenplanning nog verder uitgewerkt.

### Mijlpalenplanning Waalwijk Omgevingswet-proof 2020

Q1 - 2020	Q2 - 2020	Q3 - 2020	Q4 - 2020
Evaluatie plan van aanpak voor de invoeringsfase			Besluitvorming over Omgevingsvisie 1.0 bestaande uit bestaand beleid
Opleveren overzichten bestaande situatie			Besluitvorming over minimale acties voor de letter van de wet
Vaststelling deelprojectplannen			Besluitvorming over 1 <sup>e</sup> ronde quick wins in de geest van de wet
Afronding 1 <sup>e</sup> regionale pilot try-out DSO			

### 2021

Q1 - 2021	Q2 - 2021	Q3 - 2021	Q4 - 2021
Invoering Omgevingswet 1-1-2021	Besluitvorming over Omgevingsvisie 1.5 met gezondheid als samenhangend thema	Besluitvorming over kapstok voor het vervolg	Besluitvorming over 2 <sup>e</sup> ronde quick-wins in de geest van de wet

<sup>2</sup> Kamerbrief over voortgang invoering Omgevingswet, 29 nov 2019, <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/11/29/kamerbrief-over-voortgang-invoering-omgevingswet>

## Informatie

### Evaluatie plan van aanpak

- Wat geleerd: veel over de impact van de Omgevingswet is nog onduidelijk daardoor heeft het veel tijd gekost om een plan van aanpak te maken.
- Wat ging goed: door veel tijd te nemen was het mogelijk samen met raad, ketenpartners en interne organisatie een zorgvuldig proces te doorlopen met een mooi resultaat.
- Nieuwe ideeën: het maken van de deelprojectplannen versnellen door één basis te maken en die aan te vullen. Daarnaast nieuwe werkvormen uitproberen.
- Wat veranderen: bij volgende plan van aanpak een sneller proces inrichten door meer taken te verdelen en daar meer prioriteit voor te organiseren.



### Opleveren overzichten bestaande situatie

De actuele overzichten voor regels, vergunningen, processen, opleiding, informatie, software en samenwerking zouden volgens de routeplanner in Q4 van 2019 afgerond zijn. Het maken van de overzichten is al wel gestart en wordt afgerond in Q1 van 2020. De oplevering van de andere mijlpalen komt hiermee niet in gevaar (daarom is dit onderdeel in de samenvatting als 'geel' aangemerkt).

### Vaststelling deelprojectplannen

In dit kwartaal staat het vaststellen van de deelprojectplannen centraal. Zolang de kosten en capaciteit binnen de beschikbare en reguliere budgetten vallen, past het binnen de kaders van het plan van aanpak. Als dat niet het geval is zal de besluitvorming daarvoor in het volgende kwartaal voorbereid worden.

### Afronding 1<sup>e</sup> regionale pilot try-out DSO

Extern is in 2019 een regionale pilot try-out DSO gestart om de mogelijkheden tot samenwerking te onderzoeken op onderdelen van vergunningverlening, vergunningencheck en participatie. In Q1 van 2020 wordt deze eerste regionale try-out afgerond. In de volgende statusupdate volgt een samenvatting van de resultaten.

## **Communicatie**

In het communicatieplan van het plan van aanpak is opgenomen dat we driemaandelijks een statusupdate geven aan ketenpartners, raad, college en ambtelijk. Dit is de eerste statusupdate van 2020. Deze statusupdate is via [www.waalwijk.nl/omgevingswet](http://www.waalwijk.nl/omgevingswet) ook te raadplegen door inwoners en ondernemers. In Q4 van 2020 starten we ook met uitleg van de veranderingen specifiek voor informatie voor inwoners en ondernemers.

## **Kwaliteit**

In het plan van aanpak is als ambitie opgenomen dat we op vernieuwende wijze niet alleen de letter maar ook de geest van de Omgevingswet willen invoeren:

- De kwaliteit op basis van de letter van de wet monitoren we op de VNG-lijst minimale en advies acties.
- De kwaliteit op basis van de geest van de wet monitoren we door inzichtelijk te maken welke resultaten we behalen op de volgende verbeterdoelen: gebruiksgemak, samenhang, afwegingsruimte en besluitvorming.

In de invoeringsfase monitoren we de op te leveren resultaten. In de vervolgfase komt ook het daadwerkelijk monitoren van de verbeterdoelen bij inwoners en ondernemers aan bod.

### Letter van de wet

- VNG-lijst minimale acties: geen wijzigingen ten opzicht van plan van aanpak, bijlage 3. Monitoring.
- VNG-lijst advies acties: geen wijzigingen ten opzichte van plan van aanpak, bijlage 3. Monitoring.

### Geest van de wet

Wijze monitoring nog uit te werken op basis van de deelprojectplannen.
